

## DODATEK

ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/277 uzavřené dne 25. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZoZVZ“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2022/277-1

číslo dodatku Zhotovitele: PÚ/30 Č/2022

### Článek I.

**Objednatel:** **Město Čelákovice**  
se sídlem: náměstí 5. května 1  
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. ú.: 4127201/100  
IČ: 00240117  
DIČ: CZ00240117  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **1. SčV, a. s.**  
se sídlem: Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10  
jednající: Ing. Bc. Robert Morávek, RSHom, MBA, generální a technický ředitel  
- ve věcech smluvních a technických  
Ing. Martin Janík, provozní ředitel  
- ve věcech provozních  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. ú.: 51-8082990277/0100  
IČ: 47549793  
DIČ: CZ47549793  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním OZ, tento dodatek č. SML/2022/277-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

### Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést dílo dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku se sjednává po dohodě smluvních stran ve výši  
**3 201 302,31 Kč bez DPH.**  
K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

### Článek III.

1. Přílohou tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 28/2022/4.1.2 ze dne 1. 11. 2022.
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v tomto Dodatku, jakož i se zveřejněním Dodatku samotného v souladu s platnými předpisy a na webových stránkách města [www.celakovice.cz](http://www.celakovice.cz).

V Čelákovících dne **03. 11. 2022**



V Příbrami dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Pátek  
starosta města

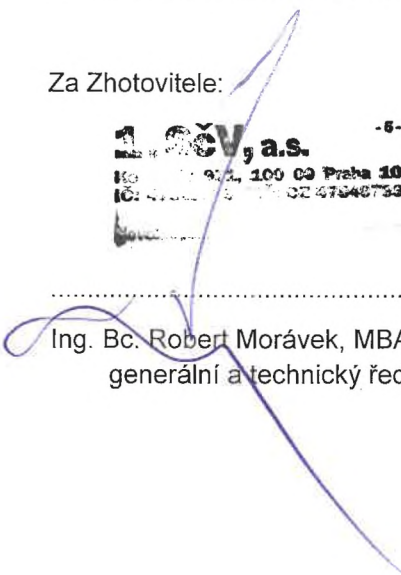

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.,  
generální a technický ředitel

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** Čelákovice – Obnova uzavíracích uzlů vodovodního řadu 2022

**Číslo projektu:**

**Objednatel:** Město Čelákovice  
náměstí 5. května 1  
250 88 Čelákovice  
IČ: 00240117

**Správce stavby (TDS):** LNConsult s. r. o.  
U Hřiště 250  
250 83 Škvorec  
IČ: 29136504

**Zhotovitel:** 1. SčV, a. s.  
Ke Kablu 971  
100 00 Praha 10  
IČ: 47549793

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ..... **1** .....

<b>VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:</b>	<b>ODSOUHLASENO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>ZAMÍTNUTO</b>	<input type="checkbox"/>

**Změna se týká těchto SO, PS:**

Čelákovice – Obnova uzavíracích uzlů vodovodního řadu 2022

**Změnu požaduje:** Objednatel  
- na základě čeho: skutečného provedení výměny sekčních šoupat

**Stručný popis změny:** Na základě odkrytí daných vodovodních uzlů bylo nutné změnit armatury dle skutečně nalezených materiálů, profilů potrubí a osazených armatur.

**Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):**

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

Časový dopad na stavbu: ANO  NE

Cena dle smlouvy o dílo: 3 255 472,16 Kč

Náklady na změnu: -54 169,85 Kč

**Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :**

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
1. etapa	786 635,20	786 635,20	37 276,40	-116 671,80	707 239,80
2. etapa	829 980,81	829 980,81	122 089,30	-40 447,00	911 623,11
3. etapa	424 895,90	424 895,90	23 172,00	-41 948,50	406 119,40
4. etapa	506 155,16	506 155,16	30 686,25	-39 790,00	497 051,40
5. etapa	707 805,10	707 805,10	8 984,00	-37 520,50	679 268,60
<b>Total/ Celkem</b>	<b>3 255 472,16</b>	<b>3 255 472,16</b>	<b>222 207,95</b>	<b>-276 377,80</b>	<b>3 201 302,31</b>

**1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):**

Jméno: Ing. Martin Janík

Datum: 03. 11. 2022

Podpis (razítko) .....

**1.SČV, a.s.** -28-  
Ke Kable 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793  
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

**2/ Stanovisko Města Čelákovice (Objednatele):**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Ing. Josef Pátek

Datum: 03. 11. 2022

Podpis (razítko) .....



**3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: 03. 11. 2022

Podpis (razítko) .....

**LNConsult** s.r.o.  
U Hřiště 250, 250 02 Kvorec  
IČ: 2913650

**Přílohy:** Změnový rozpočet

## Čelakovice - výměna sekčních uzavíracích uzlů - rekapitulace změn

Číslo	Název	Cena dle smlouvy (bez DPH)	Cena dle skutečnosti (bez DPH)	Rozdíl	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Stavba						
<b>01</b>	<b>etapa 1</b>	<b>786 635,20</b>	<b>707 239,80</b>	<b>-79 395,40</b>	<b>-116 671,80</b>	<b>37 276,40</b>
1	křížovatka ul. Rooseveltova - Lidická	191 363,53	144 868,50	-46 495,03	-61 465,73	14 970,70
2	křížovatka ul. Rooseveltova - U Hájku	146 700,27	135 708,90	-10 991,37	-33 173,07	22 181,70
3	křížovatka ulic Jaselská	129 842,90	123 372,90	-6 470,00	-6 470,00	0,00
4	ul. Rooseveltova 1295, nadzemní hydrant	144 859,50	129 420,50	-15 439,00	-15 563,00	124,00
5	etapa 1 VN Pol	173 869,00	173 869,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>etapa 2</b>	<b>829 980,81</b>	<b>911 623,11</b>	<b>81 642,30</b>	<b>-40 447,00</b>	<b>122 089,30</b>
1	Sady 17. listopadu	152 472,20	222 025,20	69 553,00	-18 156,00	87 709,00
2	vodoměrná šachta pro kulturní dům	77 066,17	74 636,47	-2 429,70	-13 451,00	11 021,30
3	křížovatka ul. Palackého a Svatopluka Čecha	209 322,53	208 620,03	-702,50	-8 840,00	8 137,50
4	křížovatka ul. Havlíčkova a Jiráskova	216 672,91	231 894,41	15 221,50	0,00	15 221,50
5	etapa 2 VN Pol	174 447,00	174 447,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>etapa 3</b>	<b>424 895,90</b>	<b>406 119,40</b>	<b>-18 776,50</b>	<b>-41 948,50</b>	<b>23 172,00</b>
1	křížovatka ulic Čelakovského, U Dubu	132 257,80	111 802,20	-20 455,60	-33 342,00	12 886,40
2	křížovatka ul. Čelakovského, U Dubu č.p. 35	115 502,90	115 623,70	120,80	-2 210,50	2 331,30
3	hydrant na konci ulice Čelakovského č.p. 23	70 419,20	71 977,50	1 558,30	-6 396,00	7 954,30
4	etapa 3 VN Pol	106 716,00	106 716,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>etapa 4</b>	<b>506 155,15</b>	<b>497 051,40</b>	<b>-9 103,75</b>	<b>-39 790,00</b>	<b>30 686,25</b>
1	ul. Smetanova - koncový hydrant u ČSOV	87 319,10	85 103,10	-2 216,00	-4 486,00	2 270,00
2	ul. Ke Křížku - hydrant u ČSOV	163 425,40	153 591,40	-9 834,00	-12 614,00	2 780,00
3	ul. U Přívozu - hydrant u ČSOV	123 049,65	125 995,90	2 946,25	-22 690,00	25 636,25
	etapa 4 VN Pol	132 361,00	132 361,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>etapa 5</b>	<b>707 805,10</b>	<b>679 268,60</b>	<b>-28 536,50</b>	<b>-37 520,50</b>	<b>8 984,00</b>
1	ul. Zálužská koncový hydrant	120 317,95	121 581,45	1 263,50	-2 740,50	4 004,00
2	křížovatka ul. Zálužská, Na Radosti	165 712,15	135 912,15	-29 800,00	-34 780,00	4 980,00
	etapa 5 VN Pol	421 775,00	421 775,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu (bez DPH)		<b>3 255 472,16</b>	<b>3 201 302,31</b>	<b>-54 169,85</b>	<b>-276 377,80</b>	<b>222 207,95</b>











### Položkový rozpočet

S:	052/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
O:	01	etapa 1
R:	05	etapa 1 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>173 869,00</b>
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	4 364,00	4 364,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	57 505,00	57 505,00
4	029113OA0	DSPS, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	02911	Vyjádření správců a vytyčení sítí	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	21361	dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00



**Položkový rozpočet**

S:	052/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
O:	02	etapa 2
R:	01	Sady 17. listopadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	vícepráce	méněpráce
N	630003203216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	kus	0,00000	2,00000	2,00000	443,00	0,00	886,00	886,00	886,00	0,00
N	28653336.A	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00
N	28653766	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	0,00000	1,00000	1,00000	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00
N	31947218	Přiruba přivařovací točivá PN 16 DN 100	kus	0,00000	2,00000	2,00000	465,50	0,00	931,00	931,00	931,00	0,00
N	733175130	Montáž tvarovek plast polyf.svař.dva spoje D 110mm	kus	0,00000	2,00000	2,00000	449,00	0,00	898,00	898,00	898,00	0,00

celkem 152 472,20    222 025,20    69 553,00    87 709,00    -18 156,00







### Položkový rozpočet

S:	052/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
O:	02	etapa 2
R:	05	etapa 2 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>174 447,00</b>
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	9 420,00	9 420,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	68 027,00	68 027,00
4	029113OA0	DSPTS, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
5	02911	Vyjádření správců a vytyčení sítě	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	21361	dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00





**Položkový rozpočet**

S:	052/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
O:	03	etapa 3
R:	01	křižovatka ulic Čelakovského, U Dubu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	vícepráce	méněpráce
N	504910000016	KOLENO PATNÍ PRÍRUBOVÉ 100	ks	0,00000	1,00000	1,00000	3 518,00	0,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00

132 257,80    111 802,20    -20 455,60    12 886,40    -33 342,00





### Položkový rozpočet

	052/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
O:	03	etapa 3
R:	04	etapa 3 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>106 716,00</b>
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	2 550,00	2 550,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	37 166,00	37 166,00
4	029113OA0	DSPS, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
5	02911	Vyjádření správců a vytyčení sítí	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	21361	dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00









**Položkový rozpočet**

52/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
04	etapa 4
R: 03	ul. U Přívozu - hydrant u ČSOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství dle skutečnosti	množství rozdíl	cena / MJ	Cena celkem dle SoD	Cena celkem dle skutečnosti	Cena celkem rozdíl	vícepráce	méněpráce
N	286134112	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návin 100 m	m	0,00000	1,00000	1,00000	46,20	0,00	46,20	46,20	46,20	0,00
celkem								123 049,65	125 995,90	2 946,25	25 636,25	-22 690,00

### Položkový rozpočet

S:	052/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
O:	04	etapa 4
R:	04	etapa 4 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>132 361,00</b>
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	7 650,00	7 650,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	52 711,00	52 711,00
4	029113OA0	DSPS, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
5	02911	Vyjádření správců a vytyčení sítí	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	21361	dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00





### Položkový rozpočet

052/2022	Čelakovice, výměna sekčních uzlů - rekapitulace změn
O: 05	etapa 5
R: 04	etapa 5 VN Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>421 775,00</b>
1	7451DIOA0	DIO	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
2	03100OA0	Nouzové zajištění pitnou vodou	kpl	1,00000	2 550,00	2 550,00
3	03110	Zavírání vody, vypouštění a napouštění, odkalení	kpl	1,00000	42 225,00	42 225,00
4	029113OA0	DSPS, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	02911	Vyjádření správců a vytyčení sítí	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	21361	dopravní značení a zabezpečení výkopu	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
7	111200001	zařízení stavenišť, doprava materiálů a strojů za všechny etapy šoupat	kpl	1,00000	300 000,00	300 000,00

Novotranspodoká 94, 2008 00  
12. 10. 2008  
IX
